

## Ⅱ. 특수공시





# 2022 회 계 연 도 특수공시 사업



☐ 우리 보령시에서 `22년에 추진한 지역숙원사업, 주차난 해소를 위한 공영주차장 설치, 당면 주요지연 현안사업 등 특수공시사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만 원)

연번	사업부서	사업명	2022년 예산액	사업량	추진상황
1	교육체육과	보령스포츠파크 조성	11,433	축구장 4면, 보조경기장 1면, 관리동, 주차장	공정률 100%
2	에너지과	튜닝센터 신축공사비	10,338	튜닝지원센터 신축 (지상1층, 연면적 2,283m)	공정률 35% (착공중)
3	해양정책과	대천항 주차타워 신축공사	4,850	주차타워 신축 1식 (3,529m <sup>2</sup> /1층2단)	준공 (2023.1.2.)
4	도시재생과	원도심 복합업무타운 신축공사	10,192	2동, 지하2층/지상4층, 연면적: 16,698.96m <sup>2</sup>	공정률 9% (흙막이 공사 진행 중)
5	교육체육과	보령 배드민턴구장 건립	2,952	지상2층 연면적 2,122m <sup>2</sup> 배드민턴구장 신축 1식	공정률 24%
6	도로과	시도9호(대천IC~해안 도로) 확포장	1,200	도로확장 L=2.1km, B=9.5m	공정률 40%
7	문화새마을과	주교면 생활문화플랫폼 조성	2,421.5	1,287m <sup>2</sup> (지상3, 지하1)	공정률 40%

# 보령스포츠파크 조성사업

- 여름철 편중된 관광패턴 분산과 스포츠를 통한 관광인프라 확대를  
대천해수욕장과 연계하여 사계절 관광 인프라 기반조성

## □ 사업개요

- 위 치 : 신흥동 산178번지 일원
- 사업량 : 스포츠파크 조성 A=120,934m<sup>2</sup>  
- 축구장 4면, 보조경기장 1면, 관리동, 주차장 등
- 사업기간 : 2016.~2023.
- 총사업비 : 368억원(국 71, 시 297)

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2022년 말 기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	36,800	7,100	-	29,700	36,060
기 투자 예산액	24,627	7,100	-	17,527	24,627
2022년 예산액	11,433	-	-	11,433	11,433
2023년 이후 예산액	740	-	-	740	

## □ 추진상황

- 2018.02.: 사업대행 위·수탁협약 체결(보령시↔충남개발공사)
- 2019.09.: 실시계획인가 고시
- 2020.04.: 지방재정 2단계 중앙투자심사 완료
- 2020.08.: 공사착공
- 2023.06.: 공사준공

## □ 기대효과

- 비수기 전지훈련, 대회 유치 등을 통한 관광객 유입으로 지역경제 활성화 기여

# □ 위치도



# □ 사진자료



<p>담당부서: 체육진흥과</p>	<p>담당자: 정도령 (☎041-930-3331)</p>
--------------------	---------------------------------

# 튜닝센터 신축공사비

- 전동화차량 튜배터리 폭파 및 연소시험 등을 연구하는 국가기술 개발과제로서 기술개발(R&D)과 기반(장비·센터) 구축사업으로 구성

## □ 사업개요

- 위 치 : 충남 보령시 주교면 관창리 1227-9(관창산업단지 관창지구 내)
- 사 업 량 : 전동화차량 튜닝지원센터 신축 (1층, 연면적2,283m<sup>2</sup>)
- 사업기간 : 2021 ~ 2025
- 총사업비 : 25,345백만원(국비 8,400, 도비 8,472.5, 시비 8,472.5)

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2022년 말 기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	25,345	8,400	8,472.5	8,472.5	3,835
기 투자 예산액	5,807	2,600	2,637	570	1,120
2022년 예산액	10,338	2,900	2,685.5	4,752.5	2,715
2023년 이후 예산액	9,200	2,900	3,150	3,150	

※산업혁신기반구축 공모사업상 국비부분 집행은 산업통상자원부에서 한국자동차연구원 직접 출연


## □ 추진상황

- 2022. 12.: 전동화차량 튜닝지원센터 신축공사 계약\*
  - \* (시 공 사) ① 건축, ②전기, ③소방, ④통신
- 2023. 01.: 전동화차량 튜닝지원센터 건설사업관리용역\* 계약
  - \* (건축감리) 포스코에이앤씨건축사사무소
- 2023. 02.: 전동화차량 튜닝지원센터 신축공사 착공\*
  - \* (착 공) 부지정지 작업 및 터파기, 파일향타 완료
- 2023. 06.: 튜닝센터 천정슬러브 타설 / 현재 공정률 35%

## □ 기대효과

- 시험센터 및 평가장비를 구축하여 지역기업의 업종전환 및 기술력 지원 등 취약한 제조업 기반 산업구조 혁신을 통해 기업유치 등 기반 마련 효과

# □ 위 치 도 (주교면 관창리 1227-9 번지 일원)

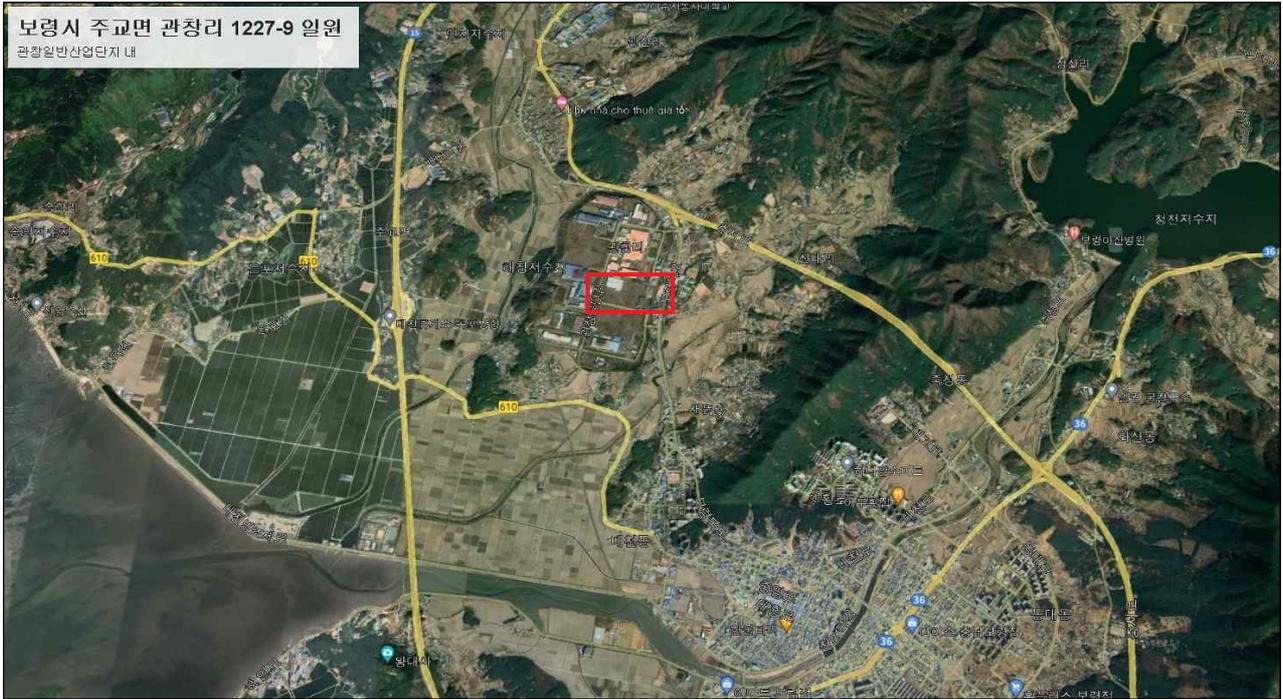

# □ 사진자료(조감도, 현장사진)



담당부서: 에너지과

담당자: 이은우 (☎041-930-6713)

# 대천항 주차타워 신축공사

- 대천항 방문(관광) 인구증가 등에 따른 문제 해소를 위해 주차타워 조성 추진으로 주차난 해소 및 방문자 편의 제공 도모

## □ 사업개요

- 위 치 : 보령시 신흑동 2242번지내(대천항 주차장부지)
- 사 업 량 : 주차타워 신축 1식(지상1층2단, 3,529㎡, 일반철골)
- 사업기간 : 2022. 5. 2. ~ 2023. 1. 2.
- 총사업비 : 6,500백만 원(국 2,500 시 4,000)

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2022년 말 기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	6,500	2,500	-	4,000	6,500
기 투자 예산액	1,650	1,325	-	325	1,650
2022년 예산액	4,850	1,175	-	3,675	4,850
2023년 이후 예산액	-	-	-	-	-

## □ 추진상황

- 2021. 3.: 기획 및 실시설계 용역 착수
- 2021.10.: 경관위원회 심의 조치 완료
- 2022. 5.: 신축공사 착공
- 2023. 1.: 주차타워 조성사업 신축공사 준공 및 운영관리

## □ 기대효과

- 대천항 항만구역 주차환경 개선에 따른 지역주민 및 관광객 편의제공

□ 위치도



□ 사진자료



담당부서: 해양정책과

담당자: 김광호 (☎ 041-930-6532)

## 원도심 복합업무타운 건립공사

- 원도심 지역 주민의 행정편의성 및 의료서비스 질 향상을 위해 복합업무타운 건립에 따른 유동 인구 발생과 원도심 지역경제 활성화 기여

### □ 사업개요

- 위 치 : 대천동 170-1번지 외 2필지(170-2, 171)
- 사업량 : 2동, 지하2층/지상4층, 연면적 16,698.96㎡
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025. 3.
- 총사업비 : 505억원[국비 46.6, 도비 11.6, 시비 446.8]

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2022년말기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	50,500	4,659	2,664	43,177	5,190
기 투자 예산액	3,543	-	-	3,543	1,937
2022년 예산액	10,192	4,128	1,032	5,032	3,253
2023년 이후 예산액	36,765	531	1,632	34,602	

### □ 추진상황

- 2018. 06.: 원도심 복합업무타운 건립계획(안) 보고
- 2020. 07.: 지방재정 중앙투자심사 승인
- 2020. 09.: 충남도 건축기획심의 승인
- 2020. 12.: 기본 및 실시설계용역 착수
- 2022. 05.: 건축허가(협의) 승인
- 2022. 06.: 전기, 통신, 소방공사 계약완료(11월 20일 착공)
- 2022. 07.: 건축공사 조달청 계약심사 완료
- 2022. 11.: 건축공사 계약완료(11월 29일 착공)

### □ 기대효과

- 보령 시민들의 문화활동 공간 제공으로 문화복지 개선 및 건강증진
- 원도심 지역주민의 행정 편의성 및 의료서비스의 질향상

## □ 위치도



## □ 사진자료



담당부서: 도시과

담당자: 인동교 (☎041-930-3872)

# 보령배드민턴구장 건립사업

- 생활체육의 수요증가에 따라 생활체육시설을 확충하여 시민의 건강증진 및 여가생활에 기여

## □ 사업개요

- 위 치 : 명천동 1089-1번지 일원
- 사업량 : 지상2층 연면적 2,122㎡(배드민턴10코트, 관람석 등)
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.
- 총사업비 : 88억원(균특 22.2, 시 65.8)

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2022년말기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	9,599	2,220	-	6,580	799
기 투자 예산액	2,312	1,740	-	572	546
2022년 예산액	2,952	480	-	2,472	253
2023년 이후 예산액	3,536	-	-	3,536	

## □ 추진상황

- 2019.08.: 보령시 지방재정 투자심사 심의
- 2021.01.: 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2022.03.: 분야별(건축,전기,소방,통신) 공사 착수 및 중지
- 2022.10.: 충청남도 지방재정 투자심사 조건부 승인
- 2023.06.: 공사추진(현재공정률 24%)

## □ 기대효과

- 생활체육시설 확충을 통한 시민 복지 증진
- 도내 및 전국 대회유치를 통한 지역경제 활성화

## □ 위치도



## □ 사진자료



담당부서: 체육진흥과

담당자: 이상헌 (☎041-930-3332)

## 시도9호(대전IC~해안도로) 확포장

- 도로 확포장으로 원활한 차량통행 및 도로이용자 안전사고 예방

### □ 사업개요

- 위 치 : 보령시 요암동~남곡동 일원
- 사업량 : 도로확장 L=2.1km, B=9.5m
- 사업기간 : 2018. 01. ~ 2025. 03.
- 총사업비 : 8,800백만 원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2022년말기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	8,800	-	-	8,800	5,466
기 투자 예산액	4,705	-	-	4,705	4,705
2022년 예산액	1,200	-	-	1,200	761
2023년 이후 예산액	2,895	-	-	2,895	-

### □ 추진상황

- 2018. 02.: 실시설계용역 착수(노선변경)
- 2019. 02.: 주민설명회 개최
- 2019.10.~12.: 도로구역결정고시 등 인·허가 절차 이행
- 2020. 01. ~ 2021. 04.: 보상협의를
- 2021. 04.: 공사계약 및 착공

### □ 기대효과

- 도시기반시설 확충 및 지역 균형개발 도모

## □ 위치도



## □ 사진자료



담당부서: 도로과 도로시설팀

담당자: 조영훈 (☎041-930-3912)

## 주교면 생활문화플랫폼 조성

- 마주침공간, 동아리실, 작은도서관 등 문화예술 및 학습공간 조성으로 생활문화 인프라 구축

### □ 사업개요

- 위 치 : 보령시 주교면 주교리 241-1 외 3필지
- 사업량 : 연면적 1,287.21㎡(지상3 / 지하1)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년
- 총사업비 : 5,919.3백만원

(단위: 백만 원)

구 분	재 원 별				집행금액 (2022년말기준)
	소 계	국 비	도 비	시 비	
총 사업비	5,919.3	1,012	1,142.5	3,764.8	2,077.9
기 투자 예산액	2,825	762	1142.5	920.5	652.7
2022년 예산액	2,421.5	250	-	2,171.5	1,425.2
2023년 이후 예산액	672.8	-	-	672.8	-

### □ 추진상황

- 2019.: 지방재정투자심사 승인, 생활SOC 복합화 사업 선정
- 2020.: 건축위원회 심의
- 2021.: 기본 및 실시설계용역 완료, 공사계약
- 2022.: 공사 착공 및 추진중 ※ 공정률: 40%('22년 12월 기준)

### □ 기대효과

- 보령시 북부 생활지역의 생활문화 인프라 구축으로 삶의 질 제고 및 문화향유권 증대를 통한 살기 좋은 도시환경 조성

## □ 위치도



## □ 사진자료



담당부서: 문화교육과

담당자: 백 힌 ☎ 041-930-3413
